9.2 Пример заполнения опросного листа для заказа КТПВЦ

Тип камеры	ШВВ
Назначение камеры	Ввод ВН №1
Коммутационный аппарат	VF12
Защита	PC83
Номинальный ток	200
Номинальное напряжение, кВ	10
Номинальный ток сборных	630
Сечение сборных шин, мм	6x60
Материал сборных шин	АД31Т
Напряжение оперативного питания	~220В
Схема главных цепей	

Тип камеры	ШВВ
Назначение камеры	Ввод ВН №1
Коммутационный аппарат	VF12
Защита	PC83
Номинальный ток	200
Номинальное напряжение, кВ	10
Номинальный ток сборных	630
Сечение сборных шин, мм	6x60
Материал сборных шин	АД31Т
Напряжение оперативного питания	~220В
Схема главных цепей	

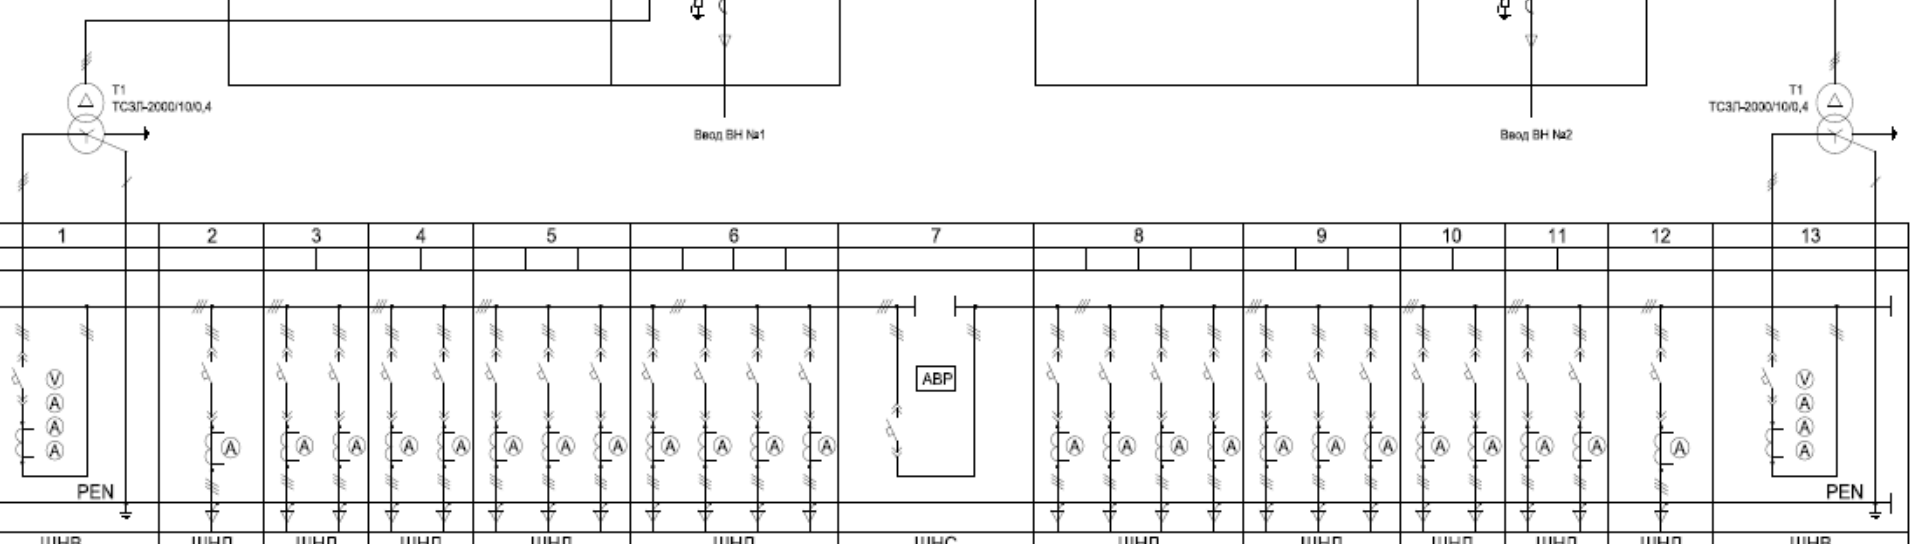

№	Запрашиваемые данные																														
1	Порядковый номер	Панели		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13															
		Фидера																													
2	Номинальное напряжение	400	В																												
3	Номинальный ток сборных шин	4000	А																												
4	Материал и сечение сборных шин	М1 3x10x100	мм																												
5	Схема главный цепей																														
6	Номинальный ток шины N	-	А																												
7	Материал и сечение шины N	-	мм																												
8	Номинальный ток шины PEN	4000	А																												
9	Материал и сечение шины PEN	М1 2x10x120	мм																												
10	Тип панели, номер схемы			ШНВ	ШНЛ	ШНЛ	ШНЛ	ШНЛ	ШНЛ	ШНС	ШНЛ	ШНЛ	ШНЛ	ШНЛ	ШНЛ	ШНВ															
11	Ширина панели, мм			1000	800	800	800	800	600	800	600	800	800	800	800	1000															
12	Назначение панели			Ввод 1	Линия	Линии	Линии	Линии	Линии	Секц. выкл	Линии	Линии	Линии	Линии	Линия	Ввод 1															
13	Тип коммутирующего защитного аппарата	Тип рубильника																													
		Номинальный ток рубильника, А																													
		Тип автом. выкл. (контатора)		UAN40C3B	UAN25B3B	UAN08A	UAN08A	UAN08A	UAN12A	UPB630	Резерв	Резерв	UPB100	UPB100	UPB250	UPB250	UAN40C3B	UPB100	UPB100	UPB250	UPB250	UPB630	Резерв	Резерв	UAN08A	UAN12A	UAN08A	UAN08A	UAN25B3B	UAN40C3B	
		Каталожный номер																													
14	Ном. ток теплового расц. или предохранителя, А			4000	2500	800	800	800	1000	630	630	630	100	100	250	250	4000	100	100	250	250	630	630	630	800	1000	800	800	2500	4000	
15	Уставки по току расцепителей автомата	Замедленного срабатывания																													
		Мгновенного срабатывания																													
16	Выдержка времени защиты от тока к. з., сек.																														
17	Ток плавкой вставки, А																														
18	Трансформаторы тока (приборы)	Класс точности		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
		Номинальный ток, А		4000/5	2500/5	800/5	800/5	800/5	1000/5	600/5	600/5	600/5	100/5	100/5	250/5	250/5		100/5	100/5	250/5	250/5	600/5	600/5	600/5	800/5	1000/5	800/5	800/5	2500/5	4000/5	
19	Трансформаторы тока (учёт)	Класс точности		0,5																										0,5	
		Номинальный ток, А		4000/5																										4000/5	
20	Количество и сечение кабелей																														
21	Ограничитель перенапряжения																														
22	Амперметр, шкала, А			0-4000	0-2500	0-800	0-800	0-800	0-1000	0-600	0-600	0-600	0-100	0-100	0-250	0-250		0-100	0-100	0-250	0-250	0-600	0-600	0-600	0-800	0-1000	0-800	0-800	0-2500	0-4000	
23	Вольтметр, шкала, В			0-500																										0-500	
24	Наличие счетчика учета электроэнергии			+																										+	
25	Тип счетчика учёта электроэнергии			Меркурий-234																										Меркурий-234	
26	Питание собственных нужд, А			+																										+	

Обязательное приложение к опросному листу - План расположения оборудования КТПВЦ
